


Informasjon Halden fengsel september 2008

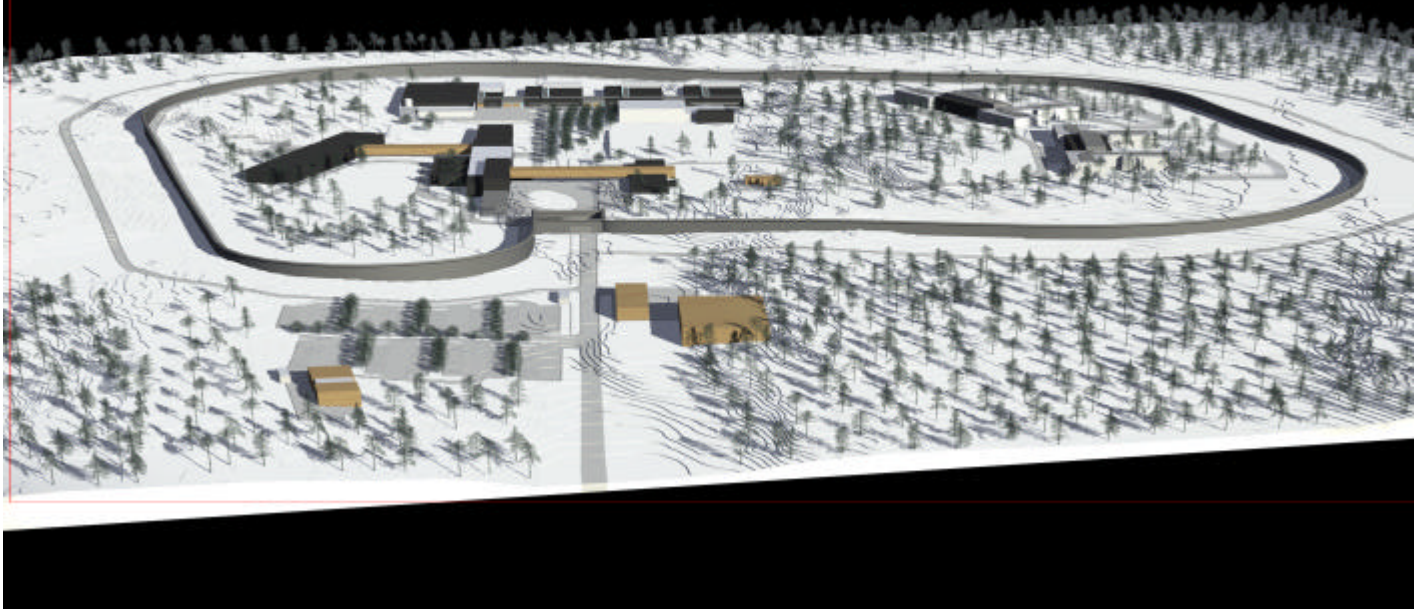

Statusopplysninger:

legget har hatt fellesferie, men det har vært jobbet noe i ferien

Alle bygningsavsnitt er nå påbegynt

Enkelte bygg er under tak

Alle bygg er i rute, med unntak av muren

Den er en uke etter skjema, tiltak for å ta det igjen er iverksatt.

Over 95 % av kontraktene er inngått

Kostnadene er innenfor rammene

Ressurser på byggeplass:

Statsbygg har 5 personer på heltid

Opak (byggeledelsen) har 5 personer på heltid og 1 person to dager i uka

Fremdriftsordinator har 1,5 personer på heltid

Bruker har 2 personer på heltid

Entreprenørene har ca 210 personer på heltid

Av disse har alle sin administrasjon på kontorriggene.

I tillegg er prosjekteringsgruppa (arkitekter, VVS, elektro og bygg) på byggeplassen 2 dager pr uke.

Det samme er Statsbyggs fagressurser fra de samme fagene.

AF gruppen er hovedbedrift og har ansvar for koordinering av de andre



Hovedsluse



Hovedkjøkken til høyre og deler av kantina til ansatte til venstre



Blokk B med åtte boenheter



Blokk B med blokk C I bakgrunnen



Boenhet med baderomskabiner på plass – status i mai måned



Samme boenhet i august



Aktivitetsbygget i august



Prøvecelle I 1:1 målestokk. Her testes det meste ut før bestilling og produksjon



Celleinnredning produseres på Ringerike fengsel. Materialer i heltre. Skrivebord, nattbord og seng



Klesskap med integrert kjøleskap



Celledør med treramme og laminatbelegg. Dørene er benyttet i mange fengsler i Sverige, og i Tromsø fengsel. Stabilt dørblad med veldig god kvalitet på ytterflatene.



Cellevindu i prøvecella. Gitterfri løsning med lufteluke.



Testvegg med teglstein – lys og mørk fuge. Den mørke er valgt. Teglstein er ett av to hovedmaterialer i fasadene.



Det andre hovedmaterialet er galvaniserte stålplater



Begynnelsen på ringmuren – sokkel og armering



Ferdig mur



Bygg A som blir mottak/varetektsavdekling – muren på vestsiden i bakgrunnen



Områdeoversikt mot nord



Oversiktsbilde mot syd.
